ザ・ヨツヤリポート

編集・発行者
ヨツヤウレタン㈱
編集者：四家正勝
yotsuya.co.jp
電話：東京
3954−2611

杉並区立高井戸中学校プール改修工事

地元の老舗丸西産業㈱様より平成二五年十二月に受注し、新年三月中旬に完成しました。

当社の現場主任は熊田が担当し、元請監督者西森社長の指揮の下、経年劣化した防水シートを撤去し住べ水㈱のサンロイドＤＮ工法（４５０㎡）で、プールサイド・通路部等はウレタン歩行用防水のロバストコート工法で改修致しました。元請監督者西森社長の指揮の下、無事故・無災害で工期内に完成致しました。（四家記）

上井草スポーツセンター走路補修

杉並区の㈱荒川建興様の受注した工事で、当社はジョギング走路のウレタン全天候型舗装ゴムチップの改修を担当しました。段差や陥没した箇所の既設舗装を撤去し、ゴムチップウレタン復旧する日本陸連認定仕様に耐えうる補修工事であった。元請監督者荒川社長の指揮の下、当社の岩瀬総将が現場を担当し無事故・無災害で工期内に完成致しました。（四家記）

杉並区立西田小学校プール改修工事

地元の老舗㈱酒井工務店様より平成二五年十二月に受注し、新年三月中旬に完成しました。

当社の現場主任は小林が担当し、プール槽内の経年劣化した防水シートを撤去し住べシート防水㈱のサンロイドＤＮ工法（４３０㎡）で、プールサイド・通路部等はウレタン歩行用防水のロバストコート工法で改修致しました。（四家記）

杉並第六小学校校舎屋上防水改修工事

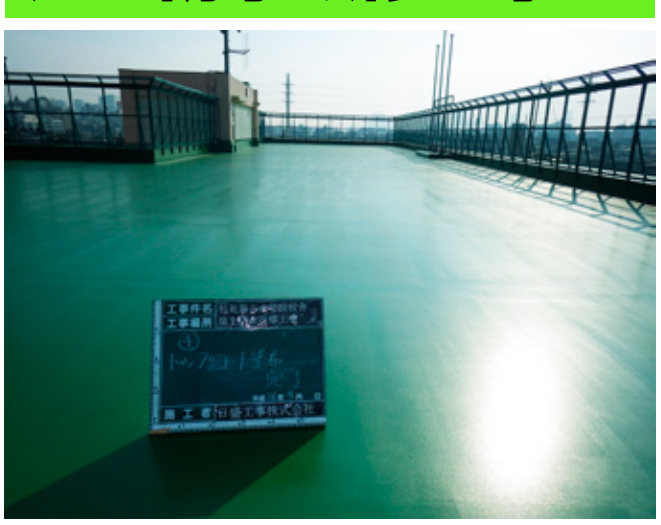

地元の老舗の日盛工事㈱様から平成二五年十二月中旬に受注し、新年三月中旬に完成しました。

当工事は既存ウレタン防水面（１９００㎡）であった、表面をサンディング・水洗いした後にウレタン歩行用防水のロバストコートＳＧ工法、及びロバストコートＷ工法で施工した工事でした。当社の現場主任は新井武夫が担当し、元請監督者の村松社長の適切な指揮の下、竣工する事ができました。（四家記）

三園浄水場ケーキ置場外一カ所屋根その他改修工事

杉並区の建和建設㈱様より受注しました。

既存のシート防水を１４００㎡撤去し、改質アスファルトシート防水で同数量、復旧する工事であった。工事の特徴として、既存防水層の全撤去が含まれていたため天候の変化には特に注意が必要であった。

元請監督者渡辺氏の指揮の下、当社の吉田が現場を担当し無事故・無災害で工期内に完成致しました。（四家記）

中野区立桃園第二小学校 他一校 プール改修工事

平成二五年十一月の中野区の綜和建設㈱様から受注し、平成二六年二月末に竣工した工事でした。プール内部は既存の劣化したシートを除去し、サンロイドDN工法で340㎡シート防水、プールサイドはウレタン防水で弾性床へ、シャワー場はプールコートにて、外装は弾性タイルで改修しました。元請監督者山村氏の指揮の下、当社の岩瀬が現場を担当し無事故・無災害で工期内に完成致しました。（四家記）

新宿区のぞみ荘で

平成二六年二月下旬、役所から発注を受け三月末に防水を完了した。当社の現場主任は岩瀬が担当し、二階から五階までのベランダ部の防水をX-2防水仕様で施工した。（都　記）

スーダン共和国にウレタン防水材料を出荷

平成二六年二月中旬、㈱鴻池組よりスーダン国ポーションで施工するODA案件のカッサラ市給水新設工事で使用するモルタル防水剤、及びウレタン防水剤を現地所長、谷口氏の指示の元横浜港から輸出しました。（土屋記）

三鷹市野崎保育園改修工事

平成二五年九月に受注し、平成二六年二月に竣工しました。

当工事は既設面の一部を取り壊し後、復旧し、また、笠木取り替えを行う改修工事のため、長い工期を要しました。

施工数量はウレタン防水X-1工法で300㎡、X-2工法で130㎡、シーリング290m、当社の施工監理は岡山建築士で施工しました。（猪野記）

杉並区立荻窪中学校校舎防水改修工事

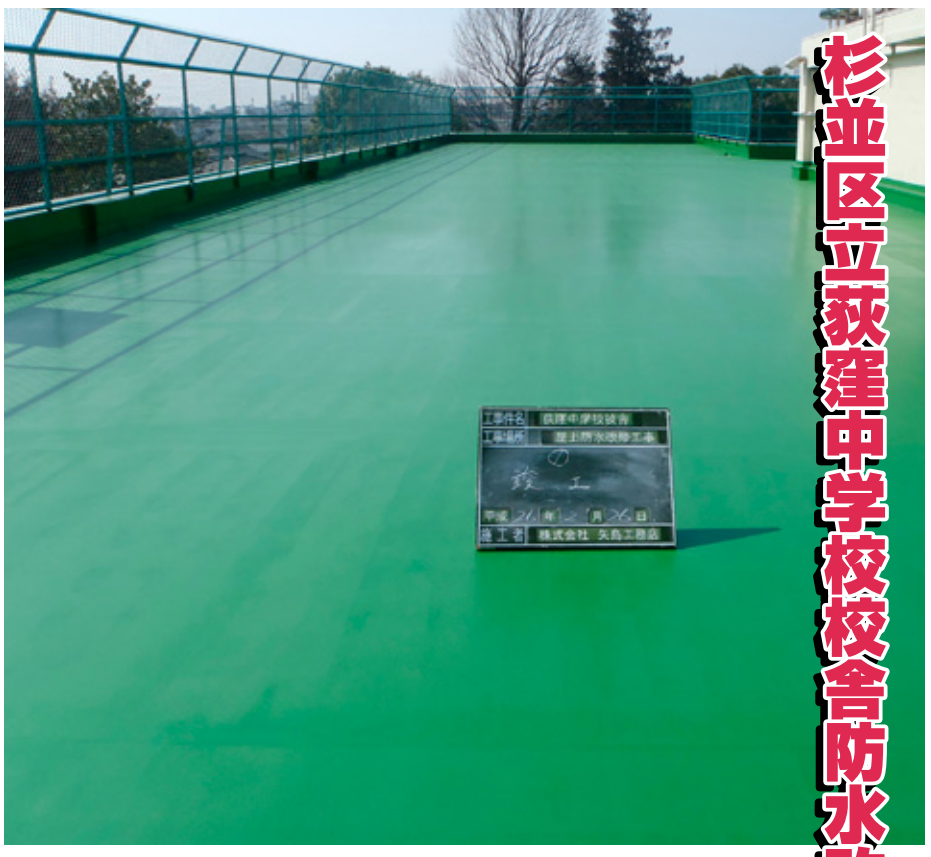

地元の老舗㈱矢島工務店様より平成二五年十一月に受注しました。

当社の現場代理人は四家昭雄が担当し、元請監督者菅原氏の指揮の下、1700㎡の屋上・屋根をロバストコートSG工法、及びロバストコートW工法で施工し、無事故・無災害で工期内に完成致しました。（高橋記）

ウレタン防水
ロバストコート
屋根及び外壁

塩ビシート防水
サンロイドDN
屋根及び外壁

ゴムチップ弾性舗装
ロバストベープ
屋上運動場

ウレタン弾性舗装
ロバスタン
屋根及び外壁
